

MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA w HRUBIESZOWIE ul. Ciesielczuka 2

TELEFON : (084)696-20-98

KONTO : Bank PEKAO S.A I O/Hrubieszów Nr 43 1240 2829 1111 0000 4029 5707

NIP : 919-10-01-706

MSD 7200.3.2023

Hrubieszów, dnia 10 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Służby Drogowej za 2022 r.

1. Podstawy prawne działalności .

1.1. Na podstawie uchwały Nr VIII/92/94 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 1994 r. została utworzona jednostka budżetowa pod nazwą Miejska Służba Drogowa, która swoje funkcjonowanie, w tej formie prawnej, rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1995 r. Zakres działania MSD w Hrubieszowie oparty jest na podstawie :

- a) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693),
- b) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.),
- c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Do podstawowych zadań Miejskiej Służby Drogowej należą :

a) z zakresu transportu :

- 1) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- 2) pełnienie funkcji inwestora;
- 3) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- 4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- 5) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na czas obrony kraju;
- 6) koordynacja robót w pasie drogowym;
- 7) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i budowę zjazdu z drogi oraz pobieranie opłat i naliczanie kar pieniężnych;

- 8) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
- 9) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
- 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
- 11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
- 12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
- 13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu drogowego wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
- 14) pobieranie opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych
- 15) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie
 - a) przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Hrubieszów
 - b) wiat przystankowych lub innych obiektów służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, bez względu na kategorię tych dróg;
- 16) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Hrubieszów;
- 17) utrzymanie, wymiana i naprawa oznakowania pionowego i poziomego oraz wprowadzanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
- 18) utrzymanie oznakowania nazw ulic, placów i skwerów na zarządzanych terenach;

b) z zakresu gospodarki komunalnej :

- 1) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
- 2) utrzymanie terenów gminnych przeznaczonych pod drogi;
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej oraz parku miejskiego wraz ze zlokalizowanymi na nich obiektami małej architektury (koszenie, sprzątanie, drobne naprawy infrastruktury);
- 4) utrzymanie przekazanych placów zabaw i obiektów rekreacyjnych oraz deptaka miejskiego;
- 5) instalowanie i naprawa koszy na śmieci na zarządzanych terenach;
- 6) administrowanie i zarządzanie tablicami oraz słupami ogłoszeniowymi;
- 7) wsparcie przy organizowaniu imprez przez Urząd Miasta i jednostki podległe

2. Dane o budżecie 2022 r.

2.1. Budżet MSD za 2022 r. po stronie dochodów wykonany został w następujących wielkościach:

- a) dz.600 , rozdz. 60016 : plan 24 450,00 zł wykonanie 32 681,03 zł
b) dz.756 , rozdz. 75618 : plan 6 700,00 zł wykonanie 7 211,75 zł

.....
RAZEM : plan 31 150,00 zł wykonanie - 39 892,78 zł - tj. 128,07%

Poniżej przedstawiono specyfikację osiągniętych dochodów :

- a) 30 248,17 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

W 2022 r. Kierownik Miejskiej Służby Drogowej działający z upoważnienia Burmistrza Miasta Hrubieszowa wydał łącznie 150 decyzji związanych z lokalizacją w pasach drogowych obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, prowadzenia robót w pasach drogowych oraz umieszczania w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej.

- b) 450,00 zł - wpływy za dzierżawę terenu.

Umowa na dzierżawę terenu zawarta została z 1 podmiotem gospodarczym,

- c) 419,00 zł - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż płytek chodnikowych),

- d) 26,19 zł - pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych zapłat,

- e) 7 211,75 zł - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

- f) 1 294,60 zł - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (barierki)

- g) 227,07 zł - zwrot nadpłat i rozliczeń z lat poprzednich

- h) 16,00 zł - zwrot kosztów postępowania administracyjnego

W 2022 r. Miejska Służba Drogowa posiadała łącznie 15 podpisanych z przewoźnikami umów na korzystanie z przystanków, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Hrubieszów.

2.2. Miejska Służba Drogowa w 2022 r. realizowała wydatki w następujących działach i rozdziałach :

- a) dz.600 rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne plan 856 773,19 zł wykonanie 822 247,15 zł
b) dz.600 rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne plan 215 854,28 zł wykonanie 215 533,28 zł
c) dz.600 rozdz. 60020 - funkcjonowanie przystanków plan 6 700,00 zł wykonanie 6 700,00 zł
d) dz.750 rozdz. 75023 - administracja publiczna plan 2 319 449,00 zł wykonanie 2 274 124,34 zł
e) dz.900 rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi plan 4 836,53 zł wykonanie 4 836,53 zł
d) dz.900 rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni plan 14 000,00 zł wykonanie 14 000,00 zł

.....
RAZEM : plan 3 417 613,00 zł - wykonanie 3 337 441,30 zł - tj. 97,65 %

Z łącznie wykonanych wydatków w wysokości 3 337 441,30 zł. na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 294 110,74 zł. tj. 98,7 %, a na wydatki majątkowe kwotę 43 330,56 zł, tj. 1,3 % wydatków ogółem. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę

1 984 472,32 zł. tj. 60,24 %, w tym nagrody jubileuszowe : **78 326,00 zł.** odprawy emerytalne **68 520,00 zł.** a wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę **107 297,92 zł.**

Na realizację zadań statutowych, oprócz wynagrodzeń i pochodnych, wydatkowano kwotę **931 305,17 zł,** tj. 28,3 % wydatków bieżących.

W roku 2022 w Miejskiej Służbie Drogowej nie wykorzystano wszystkich środków na wydatki w wysokości **80 171,70 zł.** Głównie kwota ta składa się ze środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg (mieszanka uszorstniająca) jak również zakup energii. Na realizację wydatków budżetowych ma wpływ również oszczędna gospodarka finansami Miejskiej Służby Drogowej.

3. Obszary działalności - łączna powierzchnia do utrzymania 59,94 ha

3.1. Drogi publiczne gminne :

- a) 50 odcinków o łącznej długości 20,962 km, w tym drogi nieutwardzone : 4 odcinków o łącznej długości 0,887 km,
- b) łączna powierzchnia pasów drogowych : 289 972 m² tj. 29,0 ha,
- c) utrzymanie drzew 26 szt., żywopłotów 428mb/315m², zieleńców 119720 m²,
- d) utrzymanie porządku i czystości na jezdni 123 672 m² i chodnikach 30945 m²,
- e) zimowe utrzymanie dróg: 110 odcinków o długości 37,636 km, chodniki 25977 m².

3.2. Drogi wewnętrzne i ciągi piesze :

129 odcinków o łącznej długości 51,457 km, w tym drogi nieutwardzone 96 odcinków o łącznej długości 50700 mb

Łączna powierzchnia pasów drogowych / działek / 331. 103 m² tj. 33,11 ha

3.3. Tereny zlecone przez Urząd Miasta do bieżącego utrzymania

41 odcinków o łącznej powierzchni 74,094 m² tj. 7,41 ha

3.4. Teren parku „Solidarności”.

Łączna powierzchnia 13,954 m² tj. 1,39 ha

3.5. Nasadzenia kwiatów - 8 szt. wieże kwiatowe duże + 6 szt. małe, ponad 30 szt. donic wiszących Herb Miasta Hrubieszowa, nasadzenia kwiatów w parku Solidarności i przy ul. Partyzantów jak również przy Urzędzie Miasta.

3.6. Place zabaw i siłownie – 15 szt



3.7. Przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest gmina miejska Hrubieszów - 16 szt.

3.8. Tablice i słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Hrubieszowa – 20 szt.

3.9. Kładki dla pieszych – 7 szt.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| a) ul. Piłsudskiego – ul. Krucza | 25 mb x 1,30 m, |
| b) ul. Krucza – ogrody działkowe | 12 mb x 1,60 m, |
| c) ul. Ceglana – Oś. Jagiellońskie | 26 mb x 1,00 m, |
| d) ul. Wodna – ul. Rubinowa 2 szt | 43 mb x 1,00 m i 8 mb x 1,50 m, |
| e) ul. Podzamcze – ul. 3-go Maja | 30 mb x 3,10 m, |
| f) ul. Działkowa – ul. 3-go Maja | 12 mb x 1,60 m |

4. Zadania inwestycyjne wykonane w 2022 r.

4.1. Zakupy inwestycyjne

W 2022 roku Miejska Służba Drogowa zleciła opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg gminnych - zadania pod nazwą:

- Budowa ul. Armii Krajowej II etap
- Budowa drogi wewnętrznej boczna ul. Żeromskiego (za basenem)

Koszt opracowania projektów to **19 680,00 zł.**

5. Zadania z zakresu bieżącego utrzymania wykonane w 2022 r.

5.1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych oraz terenów komunalnych i zleconych :

- a) zakup mieszanki piaskowo-solnej - **326,60 t**
- b) zakup soli drogowej - **11,22 t**

Łącznie na zimowe utrzymanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości: 169 058,22 zł.

5.2. Remonty cząstkowe na drogach gminnych i wewnętrznych

- usługa zlecona dla PRDM Hrubieszów

mieszanka mineralno – asfaltowa na gorąco ułożona mechanicznie - ogółem w 2022 r.

wyremontowano **371 m²** nawierzchni asfaltowej o wartości zadania **45 461,23 zł.**

Wykaz ulic remontowanych

drogi gminne

ul. Wyzwolenia wyremontowano 144 m² nawierzchni asfaltowej

drogi wewnętrzne

boczna ul. Żeromskiego dojazd do basenu – wyremontowano 227 m² nawierzchni asfaltowej



5.3. Remonty cząstkowe na drogach gminnych i wewnętrznych wykonane w systemie własnym przez pracowników MSD w Hrubieszowie

mieszanka mineralno – asfaltowa na zimno - ogółem zakupiono w 2022 r. **3,0 Mg**, o wartości **3 062,80 zł**, wbudowano **4 075 Mg** masy asfaltowej.


Wykaz ulic remontowanych mieszanką asfaltowo – mineralną na zimno załącznik nr 2.

5.4. Nakładki bitumiczne - usługa zlecona dla PRDM Hrubieszów.

1. Droga gminna ul. Łąkowa:

- a) wykonano frezowanie nawierzchni 12 m²
- b) skropienie remontowanego odcinka o powierzchni 1000 m² emulsją asfaltową,
- c) wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 5 cm po zawałowaniu na odcinku 250 m o powierzchni 1000 m².

Wartość zadania wyniosła **63 541,80**

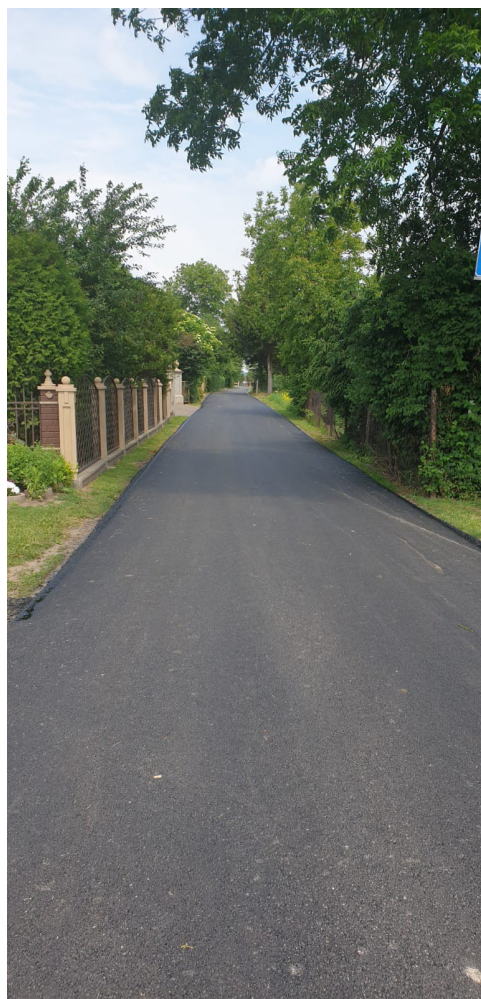

Łącznie na remonty cząstkowe i nakładki bitumiczne na drogach gminnych i wewnętrznych wydatkowano środki w wysokości : 112 065,83 zł.

5.5. Remont drogi ul. Kościuszki

1. W systemie własnym:

- a) prace ziemne ręczne i mechaniczne z odwiezieniem urobku,
- b) ustawienie krawężnika na ławie betonowej na odcinku 280 m wbudowano 33 szt. nowych krawężników
- c) wykonanie wjazdów na posesje
- d) regulacja studzienek kanalizacyjnych


Wartość wbudowanych materiałów **6 312,53 zł**

2. W systemie zleconym:

- a) wykonanie wyrównania nawierzchni masą asfaltową wbudowano 10 t
- b) skropienie całego odcinka drogi emulsją asfaltową 553 m²
- c) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, dł. 140 m – 968 m².

Razem wartość robót **50 145,10 zł.**

Łączny koszt wykonanych prac to **56 457,63 zł.**

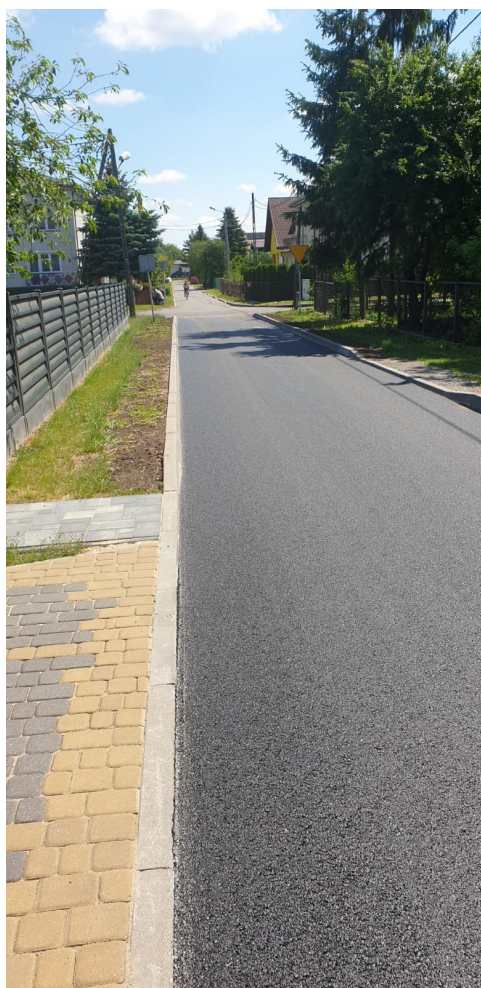

5.6. Remont ul. Krucza dwa odcinki:

1. W systemie własnym :

- a) prace ziemne ręczne i mechaniczne na odcinku 598 m z odwiezieniem urobku,
 - b) ustawienie krawężnika na ławie z betonu B-10, łącznie wbudowano 389 szt nowych krawężników
 - c) wykonanie wjazdów na posesje
 - d) naprawa (przebudowa) chodnika wbudowano 19,44 m² kostki brukowej
 - e) regulacja studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych
- Wartość wbudowanych materiałów **41 929,80 zł.**

2. W systemie zleconym:

- a) frezowanie nawierzchni w miejscach wcinki 15 m²
 - b) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 968 m²
 - d) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm wbudowano 968 m²
- Razem wartość robót **66 638,20 zł.**

Łączny koszt wykonanych prac to **108 568,00 zł.**



5.7. Remont ul. Ceglana

1. W systemie własnym :

- a) prace ziemne ręczne i mechaniczne na odcinku 100 m z odwiezieniem urobku,
 - b) wymiana podbudowy na odcinku
 - c) ustawienie krawężnika na ławie z betonu B-10, na odcinku 200 m wbudowano 29 szt nowych krawężników
 - d) wykonanie wjazdów na posesje
 - e) naprawa (przebudowa) chodnika dojdzie do schodów
 - f) regulacja studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych
- Wartość wbudowanych materiałów **9 607,91 zł.**

2. W systemie zleconym:

- a) frezowanie nawierzchni 12 m²
 - b) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 339,5 m²
 - c) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr.5 cm - wbudowano 339,5 m²
- Razem wartość robót **26 945,28 zł.**

Łączny koszt wykonanych prac to **36 553,19 zł**



5.8. Remont skrzyżowania ulic Reja i Kochanowskiego

1. W systemie własnym:

- a) prace ziemne ręczne i mechaniczne z odwiezieniem urobku,
 - b) ustawienie krawężnika na ławie betonowej - wbudowano 69 szt. nowych krawężników
- Wartość wbudowanych materiałów **2 489,78 zł.**

2. W systemie zleconym:

- a) frezowanie nawierzchni 50 m²
- b) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 362 m²
- c) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr.4 cm - ułożono 362 m²

Razem wartość robót **21 241,61 zł.**

Łączny koszt wykonanych prac to **23 731,39 zł**

5.9. Przebudowa ciągu pieszego Ceglana – Grunwaldzka (przy ogrodach działkowych)

Zakres zadania obejmował:

- a) prace rozbiórkowe polegające na zdjęciu starych płyt betonowych,
 - b) roboty ziemne wykonane ręcznie i koparką JCB z transportem urobku samochodem ciężarowym
 - c) ustawienie 400 szt obrzeży chodnikowych o wymiarach 6 x 20 x 100 cm na ławie betonowej z wykonaniem oporu,
 - d) wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo piaskowej 2,5 Mpa.,
 - e) ułożenie 438 m² nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
 - f) prace porządkowe i wyrównanie przyległego terenu
- Długość odcinka to 199 m



5.10. Poziome oznakowanie dróg gminnych w 2022 r.

usługa zlecona - Domino - Znak Lublin o wartości **40 949,16 zł.**

1 148 m² malowanie cienkowarstwowe

przejścia dla pieszych, oznakowanie kierunkowe i liniowe

Ulice : Basaja „Rysia” + rondo, Kolejowa, Wyzwolenia, Partyzantów, Plac Wolności, Plac Staszica łącznik z Partyzantów, Czerwonego Krzyża, Różana, Makowa, Fiołkowa, Konwaliowa, Lipowa, parking przy Stokrotce.

5.11. Oznakowanie pionowe dróg gminnych i wewnętrznych w 2022 r.

Zakupiono 3 szt słupków przeszkodowych U-5a, 2 lustra i 10 ocynkowanych rur do znaków drogowych.

Wartość zakupionych rur ocynkowanych do znaków drogowych, słupków przeszkodowych, lusterek, wraz z pozostałymi materiałami do oznakowania (folia, farby, rury, blacha, cement) wyniosła **8 279,04 zł.**



5.12. Remonty dróg gruntowych gminnych i wewnętrznych :

naprawa materiałem kamiennym - ogółem wbudowano **197,32 Mg** mieszanki kamiennej
Łączna wartość zakupionego przez MSD kruszywa w 2022 r to **17 058,75 zł.**

Transport materiału kamiennego i robocizna MSD w Hrubieszowie

Lokalizację i ilość wbudowanej mieszanki kamiennej przedstawia załącznik **nr 1.**

5.13. Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, wewnętrznych i ciągach pieszych, terenach komunalnych i zleconych.

Systematyczne opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie martwych, bezdomnych zwierząt domowych. Koszty poniesione za przyjęcie odpadów **55 806,55 zł** a z tytułu utylizacji odpadów zwierzęcych **1 930,50 zł.**

Robocizna i transport MSD w Hrubieszowie.

5.14. Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych, terenach komunalnych i zleconych.

Prześwietlanie drzew, cięcie odmładzające żywopłoty, wycinka krzaków, koszenie zieleńców.

Wycinka drzew:

- łącznie w 2022 roku na terenie Gminy Miejskiej zostało wyciętych 8 drzew
 - Park „Solidarności” - 4 szt.
 - ul. Basaja „Rysia” - 2 szt.
 - ul. Gródecka - 1 szt.
 - ul. Kolejowa – 1 szt.

Sprzęt, transport i robocizna MSD w Hrubieszowie.

Prace zlecone przez Urząd Miasta:

- podcinanie gałęzi drzew przy wykorzystaniu podnośnika na terenach przy wspólnotach mieszkaniowych,
- załadunek i wywóz gałęzi i liści z terenów miejskich przy wspólnotach mieszkaniowych,
- dwukrotne koszenie terenu po składowisku odpadów ul. Wyzwolenia
- koszenie terenów miejskich przy ul. Klonowej, Świerkowej i Gródeckiej

5.14. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych administrowanych przez MSD.

Prace prowadzone w zakresie: sprzątanie i utrzymanie czystości na 16 przystankach, mycie szyb, zmywanie napisów, opróżnianie koszy na śmieci, pielęgnacja nasadzeń.

Robocizna i transport MSD w Hrubieszowie

5.14. Utrzymanie 16 tablic ogłoszeniowych i 4 słupów ogłoszeniowych.

Oczyszczenie i usuwanie starych i nieaktualnych ogłoszeń i plakatów.

Robocizna i transport MSD w Hrubieszowie

6. Prace wykonane przez Miejską Służbę Drogową w 2022 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

6.1. *Uporządkowanie terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów*

- położonych przy ul. Szewskiej 7 i 9
- położonych przy ul. Żeromskiego
- przy ul. Jatkowej 11
- przy ul. Nowej 73
- przy ul. 3-go Maja przy budynku byłej kotłowni oraz schodów do wskazanego budynku
- uprzątnięcie trzech piwnic przynależnych do lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów położonych w Hrubieszowie przy ul. Polna 4/24, Polna 8/12 i Polna 9/29.
- wykonanie rozbiórki komórki gospodarczej wraz z wywozem gruzu i odpadów, położonej przy ul. Wesołej 15
- wykonanie i zamontowanie brakujących przęseł w ogrodzeniu na ul. Wesołej 15

6.2 *Zabezpieczenie budynku przy ul. Szewskiej 7 stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Hrubieszów*

- Zamknięcie lub zabicie deskami (płytą OSB) otworów okiennych i drzwiowych na poziomie parteru budynku od strony rampy oraz na poziomie niskiego parteru (w części mieszkalnej i piwnicy) w sposób uniemożliwiający dostęp do budynku osobom postronnym.
- Zagrodzenie wejścia na rampę – pomost na wysokości parteru budynku i zejście po schodach do poziomu niższego, zagrodzenie wejścia głównego na posesję od strony ul. Szewskiej.
- Oznakowanie za pomocą taśmy ostrzegawczej strefę niebezpieczną wokół budynku, w której może wystąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.
- Umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz o zakazie jego użytkowania (tablice ostrzegawcze) od strony ul. Szewskiej, od strony wschodniej (parking) oraz południowej.

6.3. *Utwardzenie drogi wewnętrznej boczna ul. Storczykowej*

Zakres wykonanych prac obejmował:

- a) wyznaczenie i wykonanie koryta drogi za pomocą koparki z odwiezieniem urobku samochodem ciężarowym
- b) wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm z piasku
- c) wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, grubości warstwy 20 cm. Wbudowano 75,5 t. kruszywa
- d) wyrównanie i uprzątnięcie terenu.
Długość wykonanego odcinka drogi to 63 m.



6.4. Rozbiórka części ogrodzenia i wykonanie chodnika z kostki brukowej na terenie Przedszkola nr 3 przy ul. Dwernickiego 4.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- a) prace ziemne wykonane ręcznie z odwiezieniem urobku,
- b) wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm z piasku,
- c) ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 w ilości szt,
- d) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
- e) prace porządkowe

6.5. Budowa miejsc postojowych na samochody osobowe oraz wjazdu przy ul. Rynek 9 w Hrubieszowie

Zakres robót:

- a) prace rozbiórkowe i wytyczenie parkingu
 - b) roboty ziemne wykonane koparką z transportem urobku samochodem ciężarowym
 - c) ustawienie 64 szt krawężników 15x30x100 na ławie betonowej z betonu B-10 o grubości 15 cm i wykonanie oporu z betonu B-10.
 - d) wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki cementowo piaskowej
 - e) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm wbudowano 70,32 t mieszanki
 - f) wykonanie 224,8 m² nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm,
 - g) prace porządkowe
- Koszt robocizny i sprzętu MSD. Hrubieszów



6.6. Budowa chodnika łączącego ul. Podzamcze z ul. Zamojską Zadanie z „Budżetu obywatelskiego”

Zakres robót:

- a) roboty ziemne wykonane ręcznie z transportem urobku samochodem ciężarowym
- b) ustawienie 107 szt obrzeży chodnikowych o wymiarach 6 x 20 x 100 cm na ławie betonowej z wykonaniem oporu,
- c) wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo piaskowej 2,5 Mpa.,
- d) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
- e) prace porządkowe i wyrównanie przyległego terenu

Długość odcinka to 51 m



6.7. Remont chodnika boczna ul Żeromskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do nowego odcinka drogi dojazdowej do basenu.

- a) prace rozbiórkowe polegające na zdjęciu kostki brukowej i usunięciu obrzeży chodnikowych wykonane ręcznie,
 - b) roboty ziemne wykonane ręcznie
 - c) ustawienie 140 szt obrzeży chodnikowych o wymiarach 6 x 20 x 100 cm na ławie betonowej z wykonaniem oporu.
 - d) wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo piaskowej 2,5 Mpa.,
 - e) ułożenie 140,3 m² nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
 - f) prace porządkowe i wyrównanie przyległego terenu
- Długość remontowanego odcinka to ok. 70 m.





6.8. Inne zadania realizowane przez MSD na zlecenie Gminy Miejskiej

- obsługa świąt patriotycznych (flagowanie miasta, sprzątanie po uroczystościach)
- obsługa imprez kulturalnych i sportowych, transport różnego rodzaju sprzętu, krzeselka, ławki, sceny namioty
- porządkowanie cmentarza wojennego, pomników i innych miejsc pamięci narodowej
- zimowe utrzymanie terenu przy budynku Urzędu Miasta
- utrzymanie terenu przy budynku ul. Staszica 9 (koszenie, zamiatanie)
- pomoc w ustawieniu Szopki Bożonarodzeniowej

7. Prace wykonane przez Miejską Służbę Drogową w 2022 roku w ramach zawartych porozumień

7.1. Budowa miejsc postojowych na samochody osobowe oraz drogi dojazdowej przy ul. Zamojskiej w Hrubieszowie porozumienie zawarte ze Wspólnotą Mieszkaniową Zamojska 175d

Zakres robót:

- a) roboty ziemne wykonane koparką z transportem urobku samochodem ciężarowym
- b) ustawienie krawężników 15x30x100 na ławie betonowej z betonu B-10 o grubości 15 cm i wykonanie oporu z betonu B-10.
- c) wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki cementowo piaskowej
- d) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm
- e) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm, 197,0 m²
- f) prace porządkowe

Koszt robocizny i sprzętu MSD. Hrubieszów według kosztorysu **22 938,05 zł brutto.**



7.2. Przebudowa zjazdu na teren Osiedla „Garnizon” od strony ul. Żeromskiego w Hrubieszowie, porozumienie zawarte ze Wspólnotą Mieszkaniową Dwernickiego 64.

Zakres robót:

- a) roboty ziemne wykonane koparką z transportem urobku samochodem ciężarowym
 - b) profilowanie i zagęszczenie podłoża
 - c) ustawienie krawężników 15 x 30x100 z wykonaniem ławy betonowej z betonu B-10 i wykonanie oporu z betonu B-10
 - d) wykonania dolnej warstwy podbudowy z mieszanki cementowo piaskowej 2,5 Mpa
 - e) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm
 - f) wykonanie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej o grubości 5 cm
- Koszt robocizny i sprzętu MSD w Hrubieszowie

7.3. Przebudowa chodnika od ul. Listopadowej do Przedszkola nr 1 w Hrubieszowie porozumienie zawarte ze Wspólnotą Mieszkaniową „Hrubieszów” ul. Listopadowa 5,7,9,11..

Zakres robót:

- a) prace rozbiórkowe polegające na zdjęciu płytek betonowych i usunięciu obrzeży chodnikowych wykonane ręcznie,
- b) roboty ziemne wykonane ręcznie z transportem urobku samochodem ciężarowym
- c) ustawienie obrzeży chodnikowych 6 x 20 x 100 cm na ławie betonowej z wykonaniem oporu, wbudowano 122 szt.
- d) wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo piaskowej 2,5 Mpa.,
- e) ułożenie 110 m² nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Długość odcinka 66,2 m.





7.4. Przebudowa chodnika od ul. Listopadowej do Przedszkola nr 1 w Hrubieszowie etap II porozumienie zawarte ze Wspólnotą Mieszkaniową „Hrubieszów” ul. Listopadowa 5,7,9,11.

Zakres robót:

- a) prace rozbiórkowe polegające na zdjęciu płytek betonowych i usunięciu obrzeży chodnikowych wykonane ręcznie,
- b) roboty ziemne wykonane ręcznie z transportem urobku samochodem ciężarowym
- c) ustawienie obrzeży chodnikowych 6 x 20 x 100 cm w ilości 40 szt. na ławie betonowej z wykonaniem oporu,
- d) wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo piaskowej 5 Mpa.,
- e) ułożenie 20 m² nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Długość odcinka 20 m.

8. Wykaz sprzętu jakim dysponuje MSD stanowi załącznik Nr 3.

Opracował :
Mariusz Biront
Kierownik MSD

**WYKAZ ILOŚCI WBUDOWANEJ MIESZANKI KAMIENNEJ
NA DROGACH GRUNTOWYCH w 2022 r.**

Lp	Data	Nazwa drogi	Ilość w tonach	Uwagi
1	luty	ul. Rubinowa	22,40 t	Przedłużenie drogi
2	luty	ul. Bursztynowa	5,12 t	pobocze
3	luty	ul. Lubelska	6,28 t	teren przy garażach
4	luty	ul. Dworcowa	2,00 t	ubytki nawierzchni
5	luty	boczna ul. Grabowieckiej za nadleśnictwem	2,76 t	pobocze
6	luty	ul. Przemysłowa	1,00 t	pobocze
7	luty	ul. Wyzwolenia	1,00 t	pobocze
8	marzec	boczna ul. Żeromskiego do ul. Uchańskiej	51,40 t	Utwardzenie na całym odcinku
9	marzec	boczna Uchańskiej do ul. Nowe Osiedle	9,86 t	Utwardzenie na całym odcinku
10	maj	boczna ul. Grabowieckiej	31,58 t	ubytki
11	maj	boczna od ul. Uchańskiej	36,8 t	ubytki
12	maj	ul. Sikorskiego	13,24 f	Utwardzenie pobocza
13	czerwiec	ul. Sobieskiego	5,58 t	pobocze
14	czerwiec	ul. Lipowa	1,4 t	Ubytki nawierzchni
15	czerwiec	ul. Partyzantów	3,36 t	Wyrównanie nawierzchni
16	wrzesień	ul. Klonowa	3,54 t	Zjazd z ul. Jodłowej
		Razem	197,32 t	

Wykaz ulic remontowanych masą asfaltową na zimno w 2022 roku

Lp.	Data	Nazwa ulicy	Ilość wbudowanej masy w kg	Uwagi
1	14.01.2022	ul. Partyzantów i rondo ul. Wyzwolenia	25	Ubytki nawierzchni
2	4.02.2022	ul. Kolejowa	25	Ubytki nawierzchni
3	7.02.2022	ul. Wyzwolenia i ul. Partyzantów	25	Ubytki nawierzchni
4	9.02.2022	ul. Hubala - Urząd Miasta	75	Ubytki nawierzchni
5	10.02.2022	ul. Kolejowa, ul. Wyzwolenia, ul. Basaja	100	Ubytki nawierzchni
6	11.02.2022	ul. Leśmiana	75	Ubytki nawierzchni
7	14.02.2022	ul. Kolejowa	25	Ubytki nawierzchni
8	16.02.2022	ul. Dworcowa	100	Ubytki nawierzchni
9	17.02.2022	ul. Lubelska	50	Ubytki nawierzchni
10	22.02.2022	Łącznik ul. Narutowicza – 3-go Maja	50	Ubytki nawierzchni
11	22.02.2022	ul. Ogrodowa i ul. Wodna	100	Ubytki nawierzchni
12	24.02.2022	ul. Łąkowa – wjazd bloki Gródecka	100	Ubytki nawierzchni
13	28.02.2022	ul. Polna wjazd do bloków 7-10 boczna ul. Krucza	175	Ubytki nawierzchni regulacja wjazdu
14	8.03.2022	boczna ul. Grabowieckiej do PZD	100	Ubytki nawierzchni
15	24.03.2022	Boczna do Kresów	250	Ubytki nawierzchni
16	5.04.2022	Dojazd do HOSiR	250	Ubytki nawierzchni
17	7.04.2022	ul. Wyzwolenia, Partyzantów, Tęczowa	25	Ubytki nawierzchni
18	14.04.2022	Łącznik Nowa -Gródecka	50	Ubytki nawierzchni
19	29.04.2022	ul. Wodna	25	Ubytki nawierzchni
20	18.05.2022	ul. Ceglana do Kurantowicza	200	Ubytki nawierzchni
21	18.05.2022	ul. Wyzwolenia	50	Ubytki nawierzchni
22	19.05.2022	ul. Ceglana do Kurantowicza	75	Ubytki nawierzchni
23	23.05.2022	ul. Kochanowskiego	50	Ubytki nawierzchni
24	20.06.2022	ul. Tęczowa	50	Ubytki nawierzchni
25	27.07.2022	ul. Partyzantów, ul. Dworcowa	150	Ubytki nawierzchni
26	27.07.2022	ul. Przemysłowa	125	Ubytki nawierzchni
27	27.07.2022	ul. Krucza	50	Zjazd na posesje
28	1.08.2022	ul. Przemysłowa	150	Ubytki nawierzchni
29	5.08.2022	ul. Dwernickiego (przedszkole)	50	Podjazd dla wózków
30	17.08.2022	ul. Żeromskiego	75	Wjazd do socjali
31	5.09.2022	ul. Ceglana	225	Zakończenie chodnika

32	13.09.2022	ul. Kolejowa, ul. Polna 7	175	Ubytki nawierzchni
33	13.09.2022	ul. Wyzwolenia, ul. Tęczowa	175	Ubytki nawierzchni
34	15.09.2022	ul. Wyzwolenia przepust	125	Regulacja wpustu ulicznego
35	28.09.2022	ul. Partyzantów	100	Ubytki nawierzchni
36	28.09.2022	ul. Wyzwolenia, ul. Ceglana	100	Ubytki nawierzchni
37	7.10.2022	ul. Kolejowa, ul. Basaja	125	Ubytki nawierzchni
38	10.11.2022	Droga dojazdowa do HOSiR	200	Ubytki nawierzchni
39	21.11.2022	ul. Partyzantów	25	Ubytki nawierzchni
40	29.11.2022	ul. Wodna	25	Ubytki nawierzchni
41	29.11.2022	ul. Długosza	50	Ubytki nawierzchni
42	30.12.2022	ul. Partyzantów	100	Ubytki nawierzchni
		Razem	4 075 kg	

**Wykaz środków transportowych
należących do Miejskiej Służby Drogowej
na dzień 31 grudnia 2022**

Lp	Nazwa środka transportowego	Rok produkcji	Wiek	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2021
1	Ciągnik Ursus C-360 (w listopadzie 2018 r zakupiono kabine o wartości 8 130,00 zł.) Przyczepa ciągnikowa	1979	43	10 930,00	10 651,00
		1979	43	1 000,00	-----
2	Ciągnik Ursus 3512 Przyczepa ciągnikowa	1995	27	20 996,09	-----
		1995	27	5 700,00	-----
3	Samochód ciężarowy wywrotka do 3,5 t Iveco	2013	9	75 210,50	45 126,30
4	Samochód ciężarowy Mercedes	1993	29	28 000,00	-----
5	Samochód ciężarowo osobowy Iveco	2006	16	49 596,14	-----
6	Samochód ciężarowo osobowy Volkswagen	2010	12	45 271,00	-----
7	Samochód dostawczy Ford Tourneo	2013	9	29 046,00	18 395,80
8	Koparko ładowarka JCB (użyczona dla MSD przez Burmistrza Miasta na czas nieokreślony	2015	7	-----	-----
9	Samochód ciężarowy Iveco Euro Cargo	2007	15	80 130,50	34 723,22
10	Samochód ciężarowy Fiat Ducato	2017	5	84 156,00	33 662,40
